


Travaux Phase N°2 du vendredi 09/10- 21h au lundi 12/10/26 – 04h



PHASE 2 : Du vendredi 09/10-21h au lundi 12 – 04h

ZONE DE TRAVAUX

DEVIATION

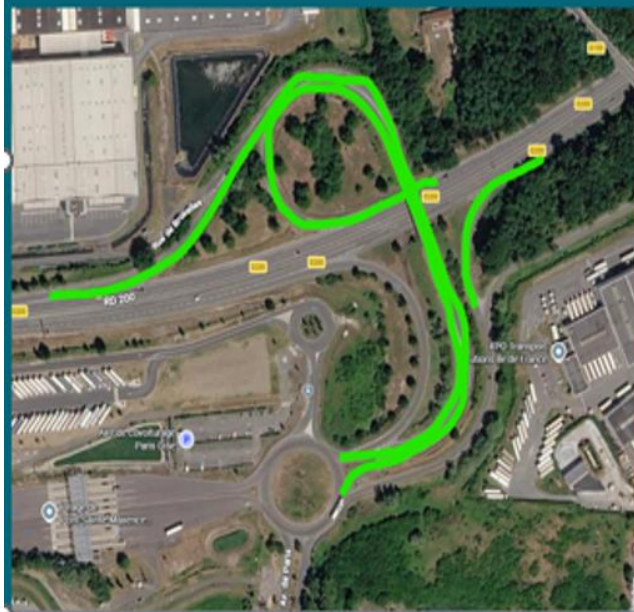

LE PLANNING PREVISIONNEL du 09/10 au 12/10

PHASE 2 : Fraisage + GB+ BBSG + SH

Phase n°2 : Du vendredi 09/10 21h00 au lundi 12/10 4h00 – Réalisation des bretelles entrante et sortante de la D200 dans le sens Compiègne – Creil et réalisation de la fin de la bretelle entrante de la D200 dans le sens Creil – Compiègne.

Exploitation :

- Fermeture de la bretelle sortante de la D200 dans le sens Compiègne – Creil.
- Fermeture au giratoire de la bretelle entrante de la D200 dans le sens Compiègne – Creil.
- Neutralisation des deux V1 dans les 2 sens de circulation.
- Fermeture partielle de la bretelle entrante de la D200 dans le sens Creil – Compiègne au niveau de la future RD156.
- les 3 bretelles vertes seront fermées.
- L'autoroute A1 peut rester ouverte, avec la bretelle sortante sens CREIL-COMPIEGNE et la « RD156 » ouverte permettant l'accès à l'échangeur suivant.
- L'accès à FM se fera par la rd 155.
- L'accès à la ZAC Paris-Oise ne sera pas impacté hormis les 2 bretelles.
- Le CRD d'ESTREES mettra une déviation en place.

